

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo
2018 m. vasario d. įsakymu Nr.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS 2013– 2016 METŲ
ATASKAITA

I. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Socialinė-ekonominė aplinka
2. Nekilnojamasis kultūros paveldas
3. Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai
4. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas
5. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas
6. Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
7. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
8. Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis planas
9. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas
10. Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
11. Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
12. Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
13. Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas
14. Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
15. Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
16. Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas

II. IŠVADOS

III. PROGNOZĖS

IV. SIŪLYMAI

I. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.	Socialinė-ekonominė aplinka						Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 28 Nepradėtos vykdyti priemonės: 10 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 43		
1.1.	Švietimo ir mokslo infrastruktūros sprendiniai						Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
1.1.1.	Profesinė mokykla	Statybos ir transporto profesinės mokyklos įsteigimas Naujojoje Akmenėje.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

1.1.2.	Akmenės karjeros planavimo centras	Įsteigtas Akmenės karjeros planavimo centras, kurio uždaviniai - bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, darbo birža, koordinuoti profesinio informavimo taškų (PIT) veiklą, organizuoti profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą, kaupti duomenis apie darbdavių poreikius ir mokymo įstaigų galimybes.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.3.	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	1. Mokyklos pastatų renovacija. 2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija. 3. Nupirkta daugiau mokyklinių autobusų.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Pastatų renovacija vykdoma. 2. Stadiono ir žaidimų aikštelės renovacijos darbai baigti 2012 m. 3. 2013 m. gautas autobusas.
1.1.4.	Akmenės rajono Akmenės gimnazija	1. Mokyklos pastatų renovacija. 2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija. 3. Nupirkta daugiau mokyklinių autobusų.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Įgyvendinta	2016	1. 2013 m. Rekonstruotas Akmenės gimnazijos pastatas. 2. Stadiono ir žaidimų aikštelės renovacijos darbai baigti 2010 m. 3. 2016 m. gautas autobusas.
1.1.5.	Akmenės rajono Ventos gimnazija	1. Stiprinti iki gimnazijos lygio 2. Mokyklos pastatų renovacija. 3. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija. 4. Nupirkta daugiau mokyklinių autobusų.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		2015 m. rekonstruotas Ventos gimnazijos pastatas
1.1.6.	Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla	1. Mokyklos pastatų renovacija. 2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija. 3. Nupirkta daugiau mokyklinių autobusų.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.7.	Papilės	1. Mokyklos pastatų renovacija.	Akmenės rajono	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

	Simono Daukanto gimnazija	2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija. 3. Nupirka daugiau mokyklinių autobusų.	savivaldybės administracija						
1.1.8.	Akmenės gimnazijos Kivylių skyrius	1. Mokyklos pastatų renovacija. 2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklos renovacija. 3. Nupirka daugiau mokyklinių autobusų.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.9.	Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos Sablauskių ugdymo skyrius	1. Mokyklos pastatų renovacija. 2. Mokyklos stadiono ir žaidimų aikštelių prie mokyklos renovacija. 3. Nupirka daugiau mokyklinių autobusų.	1 Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.10.	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Atžalynas"	1. Mokyklos darželio pastatų renovacija. 2. Mokyklos darželio žaidimų aikštelių renovacija.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2016-12-27 išduotas statybą leidžiantis dokumentas Mokslo paskirties pastato vaikų lopšelio - darželio „Atžalynas“, Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė, atnaujinimo (modernizavimo) projektui.
1.1.11.	Naujosios Akmenės lopšelis-darželis "Buratinas"	1. Mokyklos darželio pastatų renovacija. 2. Mokyklos darželio mokyklų žaidimų aikštelių prie mokyklų renovacija.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Igyvendinta	2013	2013 m. Modernizuotas darželio pastatas
1.2.	Kultūros infrastruktūros sprendiniai						Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 19 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 19		
1.2.1.	Naujosios Akmenės kultūros rūmai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2015 m. atlikti garažo remonto darbai. 2. 2016 m. sutvarkyta garso izoliacija. 3. 2016 m. atlikta anketinė

		specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas.	rajono savivaldybės kultūros centras					gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.
1.2.2.	Ventos kultūros namai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma	1. 2014 m. renovuotas kultūros namų pastatas. 2. 2016 m. atlikta anketinė gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.
1.2.3.	Papilės kultūros namai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma	1. 2015 m. renovuotas kultūros namų pastatas. 2. 2016 m. atlikta anketinė gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.

1.2.4.	Akmenės kultūros namai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2014 m. atliktas kultūros namų pastato kapitalinis remontas. 2. 2016 m. atlikta anketinė gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.
1.2.5.	Kruopių kultūros namai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2013 m. atliktas kultūros namų pastato atnaujinimas. 2. 2016 m. atlikta anketinė gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.
1.2.6	Alkiškių kultūros namai	1. Kompiuterinės technikos ir pagrindinių priemonių atnaujinimas. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (Išsiugdyti kultūros programų specialistus). 3. Kultūros centro rekonstrukcija (einamieji remontai). 4. Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui, puoselėjimui (paskaitos, seminarai, etnokultūros švenčių	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras .	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		2016 m. atlikta anketinė gyventojų kultūrinių poreikių apklausa.

		atgaivinimas ir sklaida). 5. Tradicinių renginių organizavimas. 6. Atliktas rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas.							
1.2.7.	Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. Viešosios bibliotekos pastato renovacija. 3. LIBIS programos įdiegimas. 4. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Esant galimybėms įkurti naujus filialus Šapnagiuose, Klaišiuose ir Alkiškiuose. 7. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Vykdomi pastato rekonstrukcijos darbai. 2. Darbuotojai kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 3. Bibliotekų fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis
1.2.8.	Akmenės miesto biblioteka-filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 2. 2016 m. sutvarkyta apšvietimo sistema, inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 3. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 4. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.9.	Eglesių kaimo biblioteka-filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 2. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 3. Bibliotekos fondai nuolat

									pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.10.	Ventos miesto biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Ventos miesto filialas yra renovuotose Kultūros namų patalpose. Patalpos pilnai sutvarkytos. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 4. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.11.	Agluonų kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Agluonų kaimo filialas įrengtas renovuotame daigafunkciniame centre. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.12.	Kalniškių kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Kalniškių kaimo filialas įrengtas renovuotuose Kalniškių kaimo bendruomenės namuose. Biblioteka aprūpinta kietu kuru patalpų šildymui. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją

									kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.13.	Jučių kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2016 m. filiale atliktas einamasis remontas (išdažytos grindys). Biblioteka aprūpinta kietu kuru patalpų šildymui. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.14.	Kairiškių kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Kairiškių kaimo filialas įrengtas renovuotame daugiavilniame centre. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.15.	Kivylių kaimo	1. Viešosios bibliotekos filialų	1. Akmenės	Europos Sąjungos	2008	2020	Vykdoma		1. LIBIS programos

	biblioteka - filialas	patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos					įdiegimas neįgyvendintas. 2. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 3. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 4. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.16.	Kruopių miestelio biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Filialas yra renovuotame Kruopių seniūnijos pastate. Patalpos pilnai sutvarkytos. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.17.	Papilės miestelio Kazio Narščiaus biblioteka-filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Papilės mstl. Kazio Narščiaus filialas yra renovuotame Papilės miestelio kultūros namų pastate. Patalpos pilnai sutvarkytos. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei

									organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.18.	Sablauskių kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Filialas yra renovuotame pastate. Patalpos pilnai sutvarkytos. 2. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 3. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 4. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 5. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.2.19.	Vegerių kaimo biblioteka - filialas	1. Viešosios bibliotekos filialų patalpų rekonstrukcija (einamieji remontai). 2. LIBIS programos įdiegimas. 3. Apšvietimo sistemos ir inventoriaus atnaujinimas. 5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų kartoteką.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. LIBIS programos įdiegimas neįgyvendintas. 2. Inventorius atnaujinamas pagal poreikį. 3. Darbuotojos kvalifikaciją kelia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Viešojoje bibliotekoje, kitų įstaigų bei organizacijų rengiamuose mokymuose. 4. Bibliotekos fondai nuolat pildomi ir atnaujinami naujomis knygomis.
1.3.	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros vystymo sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
1.3.1.	VšĮ Naujosios	1. Gydytojų kvalifikacijos	1. Akmenės	Europos Sąjungos	2008	2020	Vykdoma		1. Gydytojai kėlė

	Akmenės ligoninė	kėlimas. Naujų gydytojų išugdyimas ir pritraukimas. 2. Gydytojų išlaikymo rajono gydymo įstaigose programos sukūrimas. 3. Vystyti palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. 4. Pastatų ir medicininės įrangos atnaujinimas. 5. Akmenės rajono visuomenės sveikatos programų sukūrimas. 6. Medicininių atliekų likvidavimo įrangos atnaujinimas.	rajono savivaldybės administracija. 2. Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė.	paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos					kvalifikaciją. 2016 m. parengta gydytojų pritraukimo į Akmenės rajono gydymo įstaigas programa (pasinaudojo 2 gydytojais). 2. Neparengta gydytojų išlaikymo rajono gydymo įstaigose programa. 3. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje įsteigtas palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. 4. Atnaujintas VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatas (renovacija dar nepabaigta). Nuolat atnaujinama medicininė įranga (įstaiga perkasi pati, taip pat Savivaldybė skiria lėšų įrangai atnaujinti). 5. Kasmet tvirtinama Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurioje dalyvauja ir VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė.. 6. Medicinines atliekas tvarko pačios įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka (higienos norma).
1.3.2.	VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“.	1. Pirminės sveikatos priežiūros decentralizavimas ir šeimos gydytojo institucijos formavimas. 2. Gydytojų kvalifikacijos kėlimas. Naujų gydytojų išugdyimas ir pritraukimas. 3. Pastatų ir medicininės įrangos atnaujinimas. 4. Bendrosios praktikos kabinetų steigimas. 5. Psichologinės pagalbos kabinetų įsteigimas. 6. Medicininių atliekų likvidavimo įrangos	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. 3. UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Akmenės rajone veikia 5 įstaigos teikiančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugas (4 VšĮ ir 1 privati įstaiga). 2. Gydytojai nuolat kelia kvalifikaciją. 2016 metais parengta gydytojų pritraukimo į Akmenės rajoną programa. 3. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastatai atnaujinti nebuvo, vykdomas tik kosmetinis remontas.

		atnaujinimas.							Medicininė įranga nuolat atnaujinama Pastatas, kuriame įsikūręs UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“ yra atnaujintas. Įstaiga nuolat atsinaujina įrangą. 4. Bendrosios praktikos gydytojų kabinetai, šeimos gydytojų kabinetai veikia visose įstaigose, teikiančiose pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Atskirai šie kabinetai nebuvo įsteigti. 5. Medicinos psichologai dirba VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centre, kuris nuo 2016 m. spalio 1 d. prijungtas prie VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro. 6. Medicinines atliekas tvarko pačios įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka (higienos norma).
1.3.3.	VšĮ Ventos ambulatorija; VšĮ Kruopių ambulatorija; VšĮ Papilės ambulatorija	1. Stiprinti ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo, bendradarbiavimo tarp medicinos ir slaugos darbuotojų sistema. 2. Agluonų ir Sablauskių medicinos punktus pertvarkyti į ambulatorijas. 3. Pastatų ir medicininės įrangos atnaujinimas. 4. Psichologinės pagalbos specialisto darbo vietos įsteigimas.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Viešosios įstaigos: Ventos ambulatorija, Kruopių ambulatorija, Papilės ambulatorija.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Slaugos paslaugos priskiriamos skatinamosioms paslaugoms už kurias papildomai apmoka Ligonų kasos. Kuo daugiau tokių paslaugų suteikta, tuo įstaiga gauna didesnę finansavimą; galimas įstaigos slaugytojų atlyginimų kėlimas. 2. Medicinos punktai į ambulatorijas nepertvarkyti ir dėl nuolat mažėjančio gyventojų skaičiaus bei daktarų trūkumo ateityje nebus pertvarkyti. 3. Atnaujintas VšĮ Ventos ambulatorijos pastatas (tiek išorė, tiek vidus). 4. Psichologinės pagalbos specialisto darbo vietos šiose įstaigose nėra įsteigtos.

1.3.4.	Alkiškių, Agluonų, Jučių, Kivylių, Pakalniškių, Sablauskių, Klaišių ir Kairiškių medicinos punktai	1. Stiprinti medicinos punktų paslaugų teikimo, bendradarbiavimo tarp medicinos ir slaugos darbuotojų sistemą. 2. Pertvarkyti Agluonų ir Sablauskių medicinos punktus į ambulatorijas. 3. Pastatų ir medicininės įrangos atnaujinimas.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Viešosios įstaigos: Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; Kruopių ambulatorija, Papilės ambulatorija.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Medicinos punktai priklauso pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas tarp slaugytojų ir šeimos gydytojų/bendrosios praktikos gydytojų. 2. Agluonų ir Sablauskių medicinos punktai nepertvarkyti į ambulatorijas ir ateityje nebus pertvarkomi, dėl nuolat mažėjančio gyventojų skaičiaus, gydytojų trūkumo. 3. Kai kurie medicinos punktai įrengti renovuotuose daigafunkciniuose centruose. Medicinos punktuose reikalinga įranga atnaujinama pagal poreikį.
1.4.	Socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.4.1.	Nakvynės namai bei motinos ir vaiko globos centrai	Įsteigti nakvynės namus bei motinos ir vaiko globos centrą Naujojoje Akmenėje. Esant poreikiui tokie centrai galėtų atsirasti ir kituose didesniuose rajono miestuose.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 4. Akmenės rajono paramos šeimai centras.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nakvynės namus rengiasi įsteigti Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“. Akmenės rajono paramos šeimai centro ruošiasi į kurti Krizių centrą motinai ir vaikui.
1.4.2.	Įvairių, tikslinių - socialinių programų parengimas	Nedarbo ir skurdo mažinimo programų parengimas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. Įgyvendinta Akmenės rajono savivaldybės viešųjų darbų programa. 2. Įgyvendinama Akmenės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.
1.5.	Verslo ir pramonės vystymo sprendiniai						Įgyvendintos		

							priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3		
1.5.1.	Naujosios Akmenės miesto investicinio patrauklumo didinimas	Įkurti Naujosios Akmenės miesto pietinėje dalyje pramoninę zoną.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		Įkurta Akmenės laisvoji ekonominė zona, gerinama šios teritorijos infrastruktūra
1.5.2.	Smulkaus ir vidutinio verslo informavimo ir konsultavimo stiprinimas	Naujojoje Akmenėje įkurti (arba stiprinti esamą VšĮ Turizmo ir verslo informacijos centrą) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūrą	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai			Neįgyvendinta		
1.5.3.	Mažmeninės prekybos tinklo derinimas prie gyventojų gyvenamųjų vietų išdėstymo	Parengti mažmeninės prekybos plėtros ir optimizavimo programą	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.	Turizmo plėtros sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4		
1.6.1.	Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas	Vystyti gamtinį pažintinį turizmą, įrengiant pažintinius takus bei kitą reikalingą infrastruktūrą.	Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Įgyvendinta	2014	1. 2013 m. įrengtas Kamanų mokomasis takas Kamanų valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje. 2. 2014 m. įrengtas 30 m Kamanų apžvalgos bokštas.
1.6.2.	Ventos regioninis	Plėtoti tokias turizmo sritis kaip vandens turizmas, kaimo	Ventos regioninio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės	2008	2020	Neįgyvendinta		

	parkas	turizmas, gamtinį pažintinį turizmą, žvejybą ir pan.		biudžeto lėšos					
1.6.3.	Ventos upė	Išnaudoti turizmo plėtrai. Vystyti vandens turizmo maršrutą Ventos upe.	Ventos regioninio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Teikta paraiška Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 dėl Ventos upės pritaikymo vandens turizmui
1.6.4.	Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir jo buferinė zona	Galima mokslinė - tiriamoji arba gamtinė - pažintinė veiklos.	Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1.2014-2018 m. <u>Projektas WETLIFE2 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“</u> . 2. Vykdomos edukacinės ir pažintinės veiklos, vedamos gamtinės pamokos.

Teigiamos tendencijos:

Renovuota ar rekonstruota didžioji dalis rajone esančių švietimo ir kultūros įstaigų. Įkurta Akmenės laisvoji ekonominė zona, parengti veiklą joje reglamentuojantys teisės aktai. Įgyvendinami švietimo ir kultūros įstaigų atnaujinimo projektai, plečiama jų materialinė bazė. Įgyvendinama Akmenės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.

Neigiamos tendencijos: Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimas, darantis neigiamą įtaką visai socialinei-ekominei Akmenės rajono aplinkai.

2.	Nekilnojamas kultūros paveldas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.1.	Pavienių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo kryptys ir naudojimo prioritetai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.1.1.	Dvarų paveldas	Dvarų sodybos ir jų fragmentai turi būti tvarkomi, numatant tam reikalingas lėšas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2012-2014 m. įgyvendintas projektas "Paragių dvaro tvarkybos ir jo pritaikymas turizmo reikmėms". 2. Rengiamas projektas "Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos pastato Liepų g. 1, Dabikinės k. rekonstravimas, Dabikinės

									dvaro sodybos fragmentų (un. ob. k. 24), rūmų (un. ob. k. 38825), gamybos, pramonės paskirties pastato, Akmenės rajono savivaldybės, Akmenės sen., Dabikinės k., Liepų g. 1 tvarkybos ir rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą"
2.1.2.	Akmenės rajono gyvenamųjų vietovių istorinių centrų įtraukimas į Kultūros vertybių registrą	1. Inicijuoti Akmenės miesto, Papilės miestelio istorinių centrų, išsiskiriančių urbanistine kultūrine verte ir išlaikiusių autentiškumą, įtraukimą į Kultūros vertybių registrą. 2. Papilės aikštė tvarkytina kaip viešojo erdvė pasižyminti išskirtine kultūrine verte.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2020	Vykdoma		2014 m. įgyvendintas projektas "Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje".
2.1.3.	Neveikiančios kapinės	Visos neveikiančios kapinės tvarkomos pagal kapinių tvarkymo taisykles. Jų teritorijoms nustatoma pagrindinė tikslinė konservacinė žemės naudojimo paskirtis .	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		Suformuoti žemės sklypai neveikiančioms kapinėms.

Teigiamos tendencijos: Sutvarkyta Paragių dvaro teritorija ir sutvarkyti (restauruoti) Paragių dvaro pastatai bei jų priklausiniai. Atlikti restauravimo darbai Simono Daukanto paminklo Papilės miestelyje ir rekonstruota S. Daukanto aikštė, suformuota rekreatyvi ir reprezentatyvi erdvė miestelio centre. Žemės reformos žemėtvarkos projektais suformuoti žemės sklypai neveikiančioms kapinėms, ko pasekoje, visos neveikiančios kapinės Akmenės rajone bus įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Neigiamos tendencijos: Per ataskaitinį laikotarpį ne visiems Akmenės rajone esantiems kultūros paveldo objektų priežiūros ir (ar) tvarkybos darbai.

3.	Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 16		
3.1.	Vandentieka ir vandenvala						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1		

							Iš viso: 8		
3.1.1.	Teritorijos, kuriose numatoma įrengti naujas ir/ar rekonstruoti senas vandentvarkos ūkio sistemas	Akmenės II kaimo, Barvydžių, Biliūniškės, Dabikinėlės, Elgesių, Gaudžiočių, Jautmalkių, Jučių, Kairiškių (gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų tinklų plėtimui), Karniškės, Klykolių, Padvarėlių, Pakalniškių (ir vandens gerinimo įrenginiai), Papilės (gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų tinklų išplėtimui), Rudausiai, Spaigiai (ir vandens gerinimo įrenginiai), Stipirkių (išplečiant N.Akmenės sistemas), Šiaudinės, Tilžės, Vėlaičių, Vienrankių, Žerkščių (prie Ventos miesto sistemų) gyvenvietėse bei Griežių-Urbonaičių-Kalniškių, Kinkių I-Prišiškės ir Pelkelės-Dusių gyvenviečių aglomeracijose.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2014 m. Papilės miestelyje įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai.
3.1.2.	Teritorijos, kuriose numatoma įrengti naujas ir/ar rekonstruoti senas vandentiekos sistemas	Agluonų (tinklai), Akmenės (vandens gerinimo įrenginiai), Alkiškių (tinklai, vandens gerinimo įrenginiai), Dabikinės (tinklai, vandens gerinimo įrenginiai), Daubiškių, Gailaičiai (tinklai), Kairiškių (vandens gerinimo įrenginiam), Kivylių (vandens gerinimo įrenginiam), Klaišių (vandens gerinimo įrenginiai), Kruopių (tinklai, vandens gerinimo įrenginiam), Menčių (tinklai), Papilės (vandens gerinimo įrenginiam), Sablauskių (tinklai), Šapnagių (vandenvietė ir tinklai), Ventos gyvenvietėse.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		Kivylių kaime įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai.
3.1.3.	Teritorijos, kuriose	Agluonų (tinklai), Alkiškių (tinklai), Sablauskių (tinklai),	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		Menčių kaime įrengti nauji nuotekų valymo įrenginiai.

	numatomas naujų nuotekų šalinimo sistemos įrengimas ar senųjų rekonstravimas	Dabikinės (tinklai), Gailaičių (tinklai), Kruopių (tinklai), Menčių (nauji nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai), N.Akmenės (naujų nuotekų valymo įrenginių statyba bei tinklai), Sablausių (tinklai) gyvenvietėse.							
3.1.4.	Teritorijos, kuriose numatomas vandentvarkos sistemų renovavimas	Akmenės, Alkiškių (tinklai), Agluonų (tinklai), Dabikinės (tinklai), Daubiškių (NVĮ renovacija), Kairiškių (NVĮ renovacija), Kruopių (tinklai), N. Akmenės, Papilės (NVĮ ir siurblinės renovacija), Sablausių (tinklai), Ventos gyvenvietėse.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		Neįgyvendinta.
3.1.5.	Teritorijos, kuriose numatomas naujų vandentvarkos ūkio sistemų įrengimas	Barsiukų-Padarbių, Baublių, Čiunių, Dumbrių, Draginių, Gamėnų Gumbakių, Kanteikių, Mergeluičių, Meškių, Purvių, Suginčių, Šventupių, Vegerių gyvenvietėse.	UAB "Akmenės vandenys"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		Vegerių kaime išgręžtas požeminio vandens gavybos gręžinys.
3.1.6.	Teritorijos, kuriose numatomas vandentiekos sistemų įrenginiais	Barvydžių, Kivylių (tinklai), Menčių, Šapnagių (vandens gerinimo įrenginiai), Vegerių (vandens gerinimo įrenginiai) gyvenvietėse.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
3.1.7.	Teritorijos, kuriose numatomas vandentvarkos sistemų renovavimas	1. Agluonų (tinklai), Gailaičių (tinklai), Kivylių (tinklai), Papilės (tinklai), Šapnagių (tinklai) gyvenvietėse. 2. Kiti renovuojami objektai parenkami pagal tinklų nusidėvėjimą, avarijų, užsikimšimų kiekį, bei pablogėjusią vandens kokybę galutiniame taške.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
3.1.8.	Kiti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros	Bešeimininkių gręžinių likvidavimas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

	sprendiniai								
3.2.	Atliekų tvarkymas						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
3.2.1.	Atliekų surinkimo sistema	1. Įrengti Akmenės rajono atliekų tvarkymo plane numatytas bei reikalui esant papildomas konteinerines aikšteles. 2. Įrengti papildomus atliekų priėmimo punktus (APP) bei, reikalui esant, papildomas konteinerines aikšteles perspektyvinei apkrovai.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija 2. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. 2014-2015 m. Akmenės rajono savivaldybėje įrengtos 8 pusiau požeminės aikštelės. 2. 2013 m. įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Respublikos g., Naujojoje Akmenėje (Veikiančio APP vietoje).
3.2.2.	Antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko ir stiklo) surinkimo sistema	1. Atskiro popieriaus, plastiko ir stiklo surinkimo organizavimas Akmenėje, N. Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose ir Papilėje įskaitant visus gyvenamuosius individualių namų rajonus bei sodų ir garažų bendrijas. 2. Stiklo, plastiko ir popieriaus surinkimo apimčių padidinimas Akmenėje, N. Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose ir Papilėje bei antrinių žaliavų surinkimo įdiegimas visose gyvenvietėse virš 100 gyventojų.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija.. 2. UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas". 3. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. 2014 m. Individualių valdų: Pakuotės atliekų konteineriai - 4500 vnt. Stiklo konteineriai - 4500 vnt. 3. Bendro naudojimo: Plastiko - 62 vnt. Popieriaus - 62 vnt. Stiklo - 62 vnt. 2. Įsigyta 24 vnt. pusiau požeminių konteinerių (8 vnt. popieriui/kartonui, 8 vnt. plastikui, 8 vnt. stiklui).
3.2.3.	Stambiagabaričių, EEĮ, statybos ir griovimo bei pavojingų atliekų tvarkymo sistema	1. Diegiant stambiagabaričių, EEĮ, statybos ir griovimo bei pavojingų atliekų tvarkymo sistemą pradėti taikyti specialias šių atliekų surinkimo priemones (kaip pvz. surinkimas apvažiavimo būdu ar pagal iškvieta). 2. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse Akmenėje, N.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas". 3. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. 2013 m. įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Respublikos g., Naujoji Akmenė (veikiančio APP vietoje). 2. 2013-2016 m. sudarytos sąlygos gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema.

		Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose ir Papilėje įrengti buitės pavojingų atliekų bei EEĮ surinkimo punktus bei sudaryti sąlygas gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema. Rajono bei seniūnijų APP surinktas atliekas rūšiuoti pagal tolesnio tvarkymo pobūdį.	centras.						
3.2.4.	Apleistų statinių griovimas	Įvertinti apleistų statinių griovimo poreikius apskrityje ir nustatyti statybos ir griovimo atliekų panaudojimo būdus	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos.	2008	2020	Vykdoma		2016 m. nugriautas Respublikos g. 10, Naujoji Akmenė.
3.2.5.	Nuotekų valymo dumblo surinkimo ir saugojimo aikštelės	Esant poreikiui pastatyti reikiamą kiekį naujų nuotekų valymo dumblo surinkimo ir saugojimo aikštelių, iš anksto rezervuojant teritoriją jų įrengimui. Tikslus naujų nuotekų dumblo aikštelių skaičius, jų vieta bei dydis priklausys nuo pasirinkto dumblo tvarkymo būdo bei centralizacijos lygio.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB „Akmenės vandenys“.	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Įgyvendinta		Įrengta dumblo kompostavimo aikštelė
3.2.6.	Užterštų teritorijų aplinkos rizikos vertinimas	Atlikti iki šiol neinventorizuotų užterštų teritorijų aplinkos rizikos vertinimą (ARV) ir reikalui esant parengti šių teritorijų sutvarkymo projektus bei įrengti monitoringo sistemas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Įgyvendinta		
3.2.7.	Sąvartynai	Visi sąvartynai, esantys Akmenės rajone turi būti uždaryti. Juos privaloma rekultivuoti.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2020	Įgyvendinta		Visi komunalinių atliekų sąvartynai rekultivuoti.
3.2.8.	Atliekų surinkimas ir išvežimas iš miestų ir gyvenviečių viešųjų zonų	Organizuoti atliekų surinkimą ir išvežimą iš miestų ir gyvenviečių viešųjų zonų (parkai, viešojo transporto stotelės, gatvės ir kt.). Turi būti užtikrintas periodiškas surinktų atliekų bei antrinių žaliavų išvežimas į APP ar atliekų perkrovimo stotis.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija.. 2. UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		

Teigiamos tendencijos: Papilės miestelyje įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Kivylių kaime įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai. Menčių kaime įrengti nauji nuotekų valymo

įrenginiai. Naujojoje Akmenėje įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Sudarytos sąlygos gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema. Rekultivuoti visi komunalinių atliekų sąvartynai.

Neigiamos tendencijos: Nepakankama inžinerinių tinklų plėtra vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir padidinant investicinį patrauklumą.

4.	Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
4.1.	Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių kategorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.1.1.	Kelių asfaltavimas	1. Parengti vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos techniniai projektai. 2. Išasfaltuoti vietinės reikšmės keliai.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. 2013 m. Vegerių g. Naujosios Akmenės mieste rekonstravimas. 2. 2015 m. Stipirkių g. Naujosios Akmenės mieste rekonstravimo techninis projektas. 3. 2015 m. Respublikos g. Naujosios Akmenės mieste rekonstravimo techninis projektas.
4.2.	Naujosios Akmenės aplinkkelio įrengimas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.2.1.	Naujosios Akmenės miesto susisiekimo sistemos plėtra	1. Parengtas detalusis planas, skirtas sklypo aplinkkeliui suformuoti. 2. Planuojamo kelio įrengimo metu esamų inžinerinių tinklų	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

	– tiesioginio susisiekimo tarp pramoninės teritorijos bei pasienio zonos suformavimas	iškėlimas ir naujų įrengimas. Techninio projekto parengimas.							
4.3.	Kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.3.1.	Kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo	1. Pratęstas vietinės reikšmės kelias V20 Ventos mieste iki vietinės reikšmės kelio V07 Purvių kaime. Šioje planuojamoje kelio atkarpoje įrengti tiltą per Ventos upę. 2. Kelio atkarpoje įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas. 3. Kelio įrengimo metu esamų inžinerinių tinklų iškėlimas ir naujų įrengimas. 4. Vietinės reikšmės kelio V07 atkarpai (420 m) nuo sankirtos su planuojamu keliu iki sankirtos su vietinės reikšmės keliu V01 suteiktas viešo kelio statusas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
4.4.	Privažiavimo prie Rudikių ažuolo įrengimas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.4.1.	Privažiavimo prie Rudikių ažuolo įrengimas	1. Pratęstas vietinės reikšmės kelias P48 ir jo gale įrengta automobilių parkavimo aikštelė. 2. Suformuoti sklypą keliui ir	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

		automobilių parkavimo aikštelei.							
4.5.	Teritorijų rezervavimas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.5.1.	Teritorijų rezervavimas	1. Rezervuoti 20 m pločio juostą aplinkkelio įrengimui per laisvą valstybinę žemę ir suformuotus sklypus 323300070227, 323300050367, 323300070226, 324300010628, 324300010422, 324300010500, 324300010424, 324300010605, 324300010597, 324300010604, 324300010569, 324300010348, 324300010216, 324300030003. 2. Rezervuoti 20 m pločio juostą Ventos ir Purvių kaimuose per laisvą valstybinę žemę ir privatų sklypą 324100030014, vietinės reikšmės kelio V20 pratęsimui, Ventos miesto ir Purvių kaimo jungčiai. 3. Rezervuoti 10 m pločio juostą Rudikių kaime per privačius sklypus 324000040085, 324000040097, 324000040010, 324000040030 vietinės reikšmės kelio P48 pratęsimui ir automobilių apsisukimo aikštelės įrengimui.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
Teigiamos tendencijos: Naujosios Akmenės mieste rekonstruotos Vegerių, Stipirkių ir Respublikos gatvės. Neigiamos tendencijos: Nepakankama vietinės reikšmės kelių tinklo plėtra. Neįrengtas Naujosios Akmenės miesto aplinkkelis. Neįrengtas kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo.									
5.	Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1		

							Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
5.1.	Išimtys						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
5.1.1.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, kurie šiuo metu yra prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, gali būti atjungti Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, gali būti aprūpinami šiluma iš vietinės katilinės, nepriklausomai nuo to, į kurią aprūpinimo šiluma zoną jie patenka.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
Teigiamos tendencijos: Suplanuota Akmenės rajono fizinių ir juridinių asmenų centralizuotai teikiama šilumos energija. Neigiamos tendencijos:									
6.	Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 12 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
6.1.	Vėjo jėgainių parkų teritorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 11 Neįgyvendintos priemonės: 0		

							Iš viso: 11		
6.1.1.	A-1 ir A-2 Zonos	1. Zonos viduje yra gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos kelių apsaugos zonos arba jie turi būti iškeliami. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos kelių apsaugos zonos. 2. Šioje zonoje numatoma vėjo jėgainių iki 250 kW galios įrengimas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.1.2.	A-3 Zona	1. Zonos viduje yra dvi 10 kV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Pietinėje dalyje zona ribojasi su esamu naftotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šio naftotiekio apsaugos zona.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.1.3.	A-4 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Šiaurinėje dalyje zona ribojasi su esamu naftotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šio naftotiekio apsaugos zona.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

		3. Pietinėje dalyje zona ribojasi su esama 110 KV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo linijos apsaugos zona.							
6.1.4.	A-5 Zona	1. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos 10 kV orinės elektros linijos ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Zoną kerta esama 110 KV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo linijos apsaugos zona.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.1.5.	B-1 Zona	Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
6.1.6.	B-2 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Vakarinėje dalyje ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio apsaugos zona	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
6.1.7.	B-3 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV	Akmenės rajono	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti

		orinės elektros linijos. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Rytinėje dalyje ši zona ribojasi su magistraliniu dujotiekiu. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šio magistralinio dujotiekio apsaugos zona	savivaldybės administracija						
6.1.8.	C-1 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV orinės elektros linijos, transformatorinė ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Pietinėje ir vakarinėje dalyse zona ribojasi su esama 110 KV elektros perdavimo linijomis. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šių elektros perdavimo linijų apsaugos zonos.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
6.1.9.	C-2 Zona	1. Zonos viduje yra tik gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių kelių apsaugos zonos arba jie turi būti iškeliami. 2. Šiaurinėje ir vakarinėje dalyse zona ribojasi su esama 110 KV elektros perdavimo linijomis. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti

		įvertinta šių elektros perdavimo linijų apsaugos zonos.							
6.1.10.	C-3 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Zoną kerta esama 110 KV elektros perdavimo linija. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertinta šios elektros perdavimo linijos apsaugos zona	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
6.1.11.	C-4 Zona	1. Zonos viduje yra 10 KV orinės elektros linijos ir gruntiniai vietinės reikšmės keliai. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių linijų ir kelių apsaugos zonos arba šie įrenginiai turi būti iškeliami. 2. Vakarinėje ir pietinėje dalyse zona ribojasi su esamomis 110 KV ir 330 KV elektros perdavimo linijomis. Rengiant detaliuosius planus ir numatant konkrečias vietas vėjo jėgainėms turi būti įvertintos šių elektros perdavimo linijų apsaugos zonos.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
6.2.	Inžineriniai įrenginiai palaikantys vėjo jėgainių parko funkcionavimą						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
6.2.1.	Inžineriniai	1. Vietos transformatorinėms	Akmenės rajono	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

	įrenginiai palaikantys vėjo jėgainių parko funkcionavimą	pastotėms parenkamos detalieisiais planais. 2. Rengiant detaliuosius planus numatomi privažiavimo keliai prie vėjo jėgainių. Taip pat numatoma, kad kiekviena jėgainė bus sujungta su bent viena iš planuojamų transformatorinių pastočių elektros linijomis. 3. Rengiant detaliuosius planus ir parenkant konkrečias vietas vėjo jėgainėms reikia išsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus, nesant tokioms galimybėms tokių tinklų elementus perkelti prieš tai gaunant atitinkamas planavimo sąlygas. 4. Rengiant detalius planus ir parenkant vietas vėjo jėgainėms turi būti atsižvelgiama į esamą melioracijos įrenginių tinklą. Numatoma, kad melioracijos įrenginių tinklas bus išsaugotas, o jei tai neįmanoma tai atskiri įrenginiai bus iškeliami ir užtikrinamas jų funkcionavimas.	savivaldybės administracija						
Teigiamos tendencijos: Į Akmenės rajono savivaldybės administraciją buvo kreiptasi dėl detaliųjų planų planavimo sąlygų išdavimo vadovaujantis Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, ko pasekoje inicijuotas atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų rengimas, įgyvendinant bendrajame plane numatytus sprendinius. Neigiamos tendencijos: Atsižvelgiant į AB „Litgrid“ elektros tinklų išsidėstymą Akmenės rajono teritorijoje, numatytos ne visos galimos teritorijos vėjo jėgainių parkams.									
7.	Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
7.1.	Viešojo vandens tiekimo teritorijos (VVT)						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0		

							Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
7.1.1.	Naujai įsikuriantys gyventojai ar ūkio subjektai	VVT teritorijoje naujai įsikuriantys gyventojai ar ūkio subjektai turi naudotis viešojo vandens tiekėjo paslaugomis. Jei galimybės prijungti prie esamos sistemos nėra, paklojami nauji tinklai arba vartotojų poreikiai tenkinami decentralizuoto aptarnavimo būdu (vanduo pristatomas autocisterna, nuotekos surenkamos nuotekų kaupimo rezervuaruose ir kt.) arba įrengiama laikinoji infrastruktūra iki bus įrengtos centralizuotos sistemos.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		Vykdoma
7.1.2.	Į VVT teritorijas patenkantys gyventojai ar ūkio subjektai	Į VVT teritorijas patenkantys gyventojai ar ūkio subjektai, kurie nebuvo šių paslaugų gavėjai skatinami prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Ypatingas dėmesys skiriamas prisijungimams prie nuotekų tinklų.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai			Vykdoma		Vykdoma
7.2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemų plėtra						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.2.1.	Didžiosios gyvenvietės (Naujoji Akmenė, Akmenė, Venta, Papilė, Kruopiai, Kivyčiai, Alkiškiai, Daubiškiai,	2010-2020 m. įgyvendinami Ventos-Lielupės investicinio projekto II ir III etapo darbai bei savalaikiai renovacijos darbai.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB "Akmenės vandenys".	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		1. Akmenėje, Ventoje ir Papilėje pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai bei įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2. Kivyčiuose įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai. 3. Įrengta slėginė nuotekų trasa Daubiškiai – Papilė.

	Kairiškiai, Ramučiai ir Sablauskai)								
7.2.2.	Mažosios gyvenvietės (2013-2015)	Plečiamos ir naujai įrengiamos vandentvarkos sistemos: Jautmalkių, Jučių, Klyšių, Mergeluičių, Pakalniškių, Šaltiškių, Urbonaičių, Tilžės, Vegerių (Papilės seniūnija), viliošių gyvenvietėse.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB "Akmenės vandenys".	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		Vegerių kaime išgręžtas požeminio vandens gavybos gręžinys.
7.2.3.	Mažosios gyvenvietės (2016-2020)	Plečiamos ir naujai įrengiamos vandentvarkos sistemos: Draginių, Purvių, Rudausių, Stipirklių gyvenvietėse. Taip pat esant papildomam finansavimui centralizuotos sistemos turi būti įrengiamos šiose decentralizuotai aptarnaujamose gyvenvietėse Kanteikių, Kepurlaukių, Kinkių I, Meškių, Pašakarnių, Saunorių I, Vienrankių gyvenvietėse.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB "Akmenės vandenys". .	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
7.2.4.	Decentralizuotų sistemų viešojo vandens tiekimo teritorijos	Šiose teritorijose viešasis vandens tiekėjas savo paslaugas tiekia decentralizuotu būdu. Vanduo pristatomas autocisternomis ar gyventojams įrengiami vietiniai gręžiniai. Nuotekos surenkamos nuotekų kaupimo rezervuaruose, o jų šalinimui bei rezervuarų priežiūra rūpinasi viešasis vandens tiekėjas.	UAB "Akmenės vandenys"	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		
Teigiamos tendencijos: Akmenėje, Ventoje ir Papilėje pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai bei įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Kivyliuose įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai. Įrengta slėginė nuotekų trasa Daubiškiai – Papilė. Vegerių kaime išgręžtas požeminio vandens gavybos gręžinys. Neigiamos tendencijos: Nepakankama inžinerinių tinklų plėtra vystytinose teritorijose.									
8.	Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
8.1.	Naujosios Akmenės miesto sprendiniai						Įgyvendintos		

							priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.1.1.	Sprendinių įgyvendinimas techniniais projektais	Išduoti statybą leidžiantys dokumentai pagal parengtus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) techninius projektus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma	-	1. 2013.06.13 - LNS-62-130613-00019. 2. 2013.09.25 - LNS-62-130925-00028. 3. 2013.09.25 - LNS-62-130925-00029. 4. 2014.10.03 - LNS-62-141003-00024 5. 2014-10-07 - LNS-62-141007-00025 6. 2014-10-07 - LNS-62-141007-00026 7. 2014-10-07 - LNS-62-141007-00027 8. 2014-10-15 - LNS-62-141015-00029 9. 2014-10-15 - LNS-62-141015-00030 10. 2014-10-24 - LNS-62-141024-00031 11. 2014-10-28 - LNS-62-141028-00032 12. 2015-04-23 - LNS-62-150423-00008 13. 2015-05-06 - LNS-62-150506-00012 14. 2015-05-25 - LNS-62-150525-00017 15. 2015-08-07 - LNS-62-150807-00028 16. 2015-08-07 - LNS-62-150807-00029 17. 2016-01-12 - LNS-62-160112-00002 18. 2016-01-21 - LNS-62-160121-00005
8.2.	Akmenės miesto sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 0		

							Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.2.1.	Sprendinių įgyvendinimas techniniais projektais	Išduoti statybą leidžiantys dokumentai pagal parengtus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) techninius projektus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma	-	1. 2013.02.05 - LNS-62-130205-00002 2. 2013.02.22 - LNS-62-130222-00005 3. 2013.09.25 - LNS-62-130925-00030 4. 2013.10.01 - LNS-62-131001-00032 5. 2015-02-02 - LNS-62-150202-00002 5. 2015-05-14 - LNS-62-150514-00015 6. 2015-07-14 - LNS-62-150714-00023 7. 2015-07-14 - LNS-62-150714-00024 8. 2015-09-10 - LNS-62-150910-00031 9. 2015-09-10 - LNS-62-150910-00032 10. 2015-11-10 - LNS-62-151110-00038 11. 2015-11-10 - LNS-62-151110-00039 12. 2016-08-11 - LAP-62-160811-00001
8.3.	Ventos miesto sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.3.1.	Sprendinių įgyvendinimas pagal techninius	Išduoti statybą leidžiantys dokumentai pagal parengtus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo)	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma	-	1. 2014.01.07 - LNS-62-140107-00001 2. 2015-01-05 - LNS-62-150105-00001

	projektus	techninius projektus.							3. 2015-04-23 - LNS-62-150423-00009
Teigiamos tendencijos: Vykdam daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo darbus, vadovaujamasi specialiojo plano sprendiniais. Neigiamos tendencijos: Ribotas dokumento aktualumas, po atnaujinimo (modernizavimo) veiklų įvykdymo.									
9.	Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4:		
9.1.	Sprendinių įgyvendinimo priemonės						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.1.1.	Valstybinės žemės rezervavimas ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams	Parengtos valstybinės žemės rezervavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros atitinkančios teritorijų planavimo dokumentus, kuriais būtų suformuoti žemės sklypai dviračių takų įrengimui už valstybinės reikšmės kelių ir vietinių kelių žemės juostų ribų;	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
9.1.2.	Valstybinės žemės rezervavimo procedūros atitinkančios teritorijų planavimo dokumentus	Parengtos valstybinės žemės rezervavimo procedūros atitinkančios teritorijų planavimo dokumentus, kuriais būtų suformuoti žemės sklypai poilsio aikštelėms su informacine ir poilsio infrastruktūra įrengti	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
9.1.3.	Techniniai projektai	1. Parengti pėsčiųjų ir dviračių trasų ar jų atkarpų techniniai projektai. 2. Parengti poilsio aikštelių su informacine ir poilsio infrastruktūra techniniai	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

		projektai.							
9.1.4.	Turistinių maršrutų schemos	Parengti specialiuoju planu siūlomų turistinių maršrutų Akmenės rajone su esama aptarnavimo infrastruktūra schemas.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2013-03-28 patvirtintas Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas.
Teigiamos tendencijos: Parengtas Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas. Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.									
10.	Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas						Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
10.1.	Sprendinių įgyvendinimo priemonės						Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
10.1.1.	Techniniai projektai	Igyvendinant specialiojo plano sprendinius, t.y. rengiant techninius projektus būtina tikslinti lietaus nuotekų infrastruktūros išsidėstymą planuojamoje teritorijoje	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2014 m. parengtas techninis projektas.
10.2.	Teritorijų rezervavimas specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui						Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
10.2.1.	Teritorija šalia	Rezervuoti 4 a sklypą laisvoje	Akmenės rajono	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti

	mokyklos	valstybinėje žemėje šalia mokyklos, lietaus nuotekų valyklos ir išleistuvo įrengimui. Parengti detalųjį planą ar žemės valdos projektą šiai teritorijai suformuojant sklypą tinkamą nuotekų valyklai, numatyti žemės paskirtį inžinerinės infrastruktūros statybai	savivaldybės administracija						
10.2.2.	Teritorija šalia Kranto gatvės	Rezervuoti 4 a žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje šalia Kranto gatvės (tarp Kranto gatvės ir Ventos upės), lietaus nuotekų valyklos ir išleistuvo įrengimui. Parengti detalųjį planą ar žemės valdos projektą šiai teritorijai suformuojant sklypą tinkamą nuotekų valyklai, numatyti žemės paskirtį inžinerinės infrastruktūros statybai.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
10.2.3.	Teritorija šalia rajoninio kelio Nr.1027	Rezervuoti 4 a žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje šalia rajoninio kelio Nr.1027 (už kelio juostos ribų. Prie melioracijos griovio), lietaus nuotekų valyklos ir išleistuvo įrengimui. Parengti detalųjį planą ar žemės valdos projektą šiai teritorijai suformuojant sklypą tinkamą nuotekų valyklai, numatyti žemės paskirtį inžinerinės infrastruktūros statybai.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti
10.2.4.	Teritorija šalia Raudonskardžio g. esančio melioracijos griovio	Rezervuoti 4 a žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje šalia Raudonskardžio g. esančio melioracijos griovio, lietaus nuotekų valyklos ir išleistuvo įrengimui. Parengti detalųjį planą ar žemės valdos projektą šiai teritorijai suformuojant sklypą tinkamą nuotekų valyklai, numatyti žemės paskirtį inžinerinės infrastruktūros statybai.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti	-	Nepradėta vykdyti

Teigiamos tendencijos: Parengtas Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros techninis projektas.

Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyti.

11.	Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 10		
11.1.	Rekreacinių teritorijų, turizmo (aptarnavimo) centrų ir teritorijų naudotinų/svarbių pažintinei rekreacijai apibūdinimas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 10		
11.1.1.	Teritorija ties Kivylių tvenkiniu	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra; 2. Įrengta poilsiavietė; 3. Įrengta stovyklavietė; 4. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė; 5. Įrengti sporto įrenginiai; 6. Įrengtas informacinis stendas; 7. įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2.. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		
11.1.2.	Teritorija ties Klykoliais	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra. 2. Įrengta poilsiavietė. 3. Įrengtas informacinis stendas. 4. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		
11.1.3.	Teritorija ties Naujosios Akmenės karjerai	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra; 2. Įrengta poilsiavietė; 3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė; 4. Įrengta infrastruktūra ekstremalaus slidinėjimo	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 3. Naujosios Akmenės kaimiškoji	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		

		trasoms, lauko dažasvydžio organizavimas, sunkiai pravažiuojamos trasos keturračiams, motokrosui ir pan.	seniūnija.						
11.1.4.	Teritorija ties Menčių karjerai	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra. 2. Įrengta poilsiavietė. 3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė. 4. Organizuojamos ekskursijos į Menčių karjerą, kuriame žmonės supažindinami su karjero eksploatacijos darbais bei susiformavusia žemės gelmių geologine sandara. 5. Įrengta infrastruktūra ekstremalaus slidinėjimo trasoms, lauko dažasvydžio organizavimas, sunkiai pravažiuojamos trasos keturračiams, motokrosui ir pan.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 3. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		
11.1.5.	Teritorija ties Sablauskių tvenkiniu	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra; 2. Įrengta poilsiavietė; 3. Įrengta stovyklavietė; 4. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė; 5. Įrengti sporto įrenginiai; 6. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija.. 3. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		
11.1.6.	Ventos regioninio parko teritorija	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra. 2. Įrengtos poilsiavietės. 3. Įrengtos atokvėpio vietos. 4. Įrengtos apžvalgos aikštelės. 5. Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. 6. Įrengti laiptai prie lankomų objektų. 7. Įrengtas lankytojų centras. 8. Įrengtos lauko ekspozicijos. 9. Įrengti informaciniai stendai.	Ventos regioninio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. 2015 m. pastatytas 15 metrų apžvalgos bokštas Daubiškių k. 2. 2015 m. pastatytas lankytojų centras. 3. 2016 m. pastatytas informacinis stendas Papilės mieste.
11.1.7.	Šaltiškių karjeras	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra.	1. Akmenės rajono	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėti vykdyti		Nepradėta vykdyti

		2. Įrengta poilsiavietė. 3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė. 4. Įrengtas jūros periodo parkas su reikalinga infrastruktūra. 5. Įrengta infrastruktūra ekstremalaus slidinėjimo trasoms, lauko dažasvydžio organizavimas, sunkiai pravažiuojamos trasos keturračiams, motokrosui ir pan.	savivaldybės administracija. 2. Papilės seniūnija.						
11.1.8.	Pakalniškių karjeras	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra. 2. Įrengta poilsiavietė. 3. Įrengta pramoginė žvejyba su reikalinga infrastruktūra. 4. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė	1 Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Kruopių seniūnija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		Neįgyvendinta
11.1.9.	Alkiškių karjeras	1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga infrastruktūra. 2. Įrengta poilsiavietė. 3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių stovėjimo aikštelė. 4. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė. 5. Įrengti sporto įrenginiai.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		
11.1.10	Dviračių–pėsčiųjų takų tęsiniai	Papildomai įrengti ir esamų dviračių–pėsčiųjų takų tęsinius iki Ramybės slėnio, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (Kamanų g.), Akmenės gamtos ir kultūros parko, sujungti Akmenės m. ir Alkiškių k. dviračių–pėsčiųjų taku, taip pat pratęsti esamą dviračių–pėsčiųjų taką iki N. Akmenės bei iki N. Akmenės karjerų teritorijos	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2013 m. parengtas Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato Pušų g. 2, Akmenės II k. į gamtos ir kultūros parko įrengimo techninis projektas.
Teigiamos tendencijos: Pastatytas 15 metrų apžvalgos bokštas Daubiškių k., Papilės sen. Pastatytas Ventos regioninio parko lankytojų centras. Pastatytas informacinis stendas Papilės mieste. Parengtas Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato Pušų g. 2, Akmenės II k. į gamtos ir kultūros parko įrengimo techninis projektas. Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.									
12.	Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0		

							Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
12.1.	Specialiojo plano sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
12.1.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	Parengtas techninis projektas.	UAB „Akmenės vandenys“	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
Teigiamos tendencijos: Parengtas Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas. Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.									
13.	Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 9		
13.1.	Specialiojo plano sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 5		
13.1.1.	Vandens turizmo infrastruktūra	Įrengtos trys naujos įlipimo/išlipimo vietos baidarėms prie lankomų objektų Nr. 12 (Papilės Jūros periodo atodanga), Nr. 8 (Jurakalnio Jūros geologinė atodanga ir atragis) Nr. 10 (Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada), kuriose įrengtos	Ventos regioninio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		2015 m. Įrengta prieplauka Nr. 8 (Jurakalnio Jūros geologinė atodanga ir atragis)

		baidarių ir valčių prieplaukos su atitinkama informacine infrastruktūra (informacinėmis rodyklėmis, nurodančiomis apie lankomus objektus).							
13.1.2.	Auto transporto trasos, privažiavimai prie objektų, automobilių stovėjimo aikštelės	Įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles prie objektų Nr. 10 (Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada), Nr. 11 (Papilės piliakalnis II), Nr. 13 (Raudonskardžio geologinė atodanga). Esamą privažiavimą prie pakrantės palikti, jis skirtas pakrančių priežiūrai, privažiuoti su specialia technika.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Įgyvendinta	2013	Įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė prie objektų Nr. 10 (Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada) Nr. 13 (Raudonskardžio geologinė atodanga)
13.1.3.	Dviračių takai	Įrengti dviračių sustojimo vietas ties esamomis ir planuojamomis automobilių stovėjimo aikštelėmis.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Neįgyvendinta		
13.1.4.	Pėsčiųjų, dviračių, žirgų jodinėjimo takai	1. Įrengti naujus pėsčiųjų takus, kurie apjungtų esamus takus į vientisą infrastruktūros tinklą. 2. Įrengti pėsčiųjų/žirgų taką nuo lankomo objekto Nr.14 (Augustaičių vandens malūnas ir žirgynas). 3. Įrengti tris naujus tiltus/lieptus, skirtus pėstiesiems. Tiltus/lieptus numatoma įrengti per Ventos upę ties objektais Nr. 12 (Papilės Jūros periodo atodanga) ir Nr. 15 (Daubiškių slėnis su lauko estrada). Tiltas/lieptas numatomos iki objekto Nr. 11 (Papilės piliakalnis II), sudarant galimybę prieiti prie lankomo objekto, jį pritaikant turizmui. 4. Takų, tiltų konstrukciniai sprendimai, jų vieta bei įrengimo galimybės sprendžiamos techninių	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2014 m. įrengtas Jurakalnio geologinis- pažintinis takas Papilės seniūnijoje

		projektų rengimo metu.							
13.1.5.	Informacinė infrastruktūra (informaciniai stendai, rodyklės)	Informacinio stendo įrengimas prie lankomo objekto Nr. 11 (Papilės piliakalnis II) ir informacinių rodyklių įrengimas iki objekto Nr. 12 (Papilės Jūros periodo atodanga). Plėtoti vandens turizmo informacinę infrastruktūrą prie Ventos upės, įrengti informacines rodykles prie lankomų objektų, ties numatytomis baidarių įlipimo/išlipimo vietomis.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		
13.2.	Kita infrastruktūra (poilsio, žaidimo, apžvalgos aikštelės, laužavietės, palapinių pastatymo vietos, poilsia vietės, maudyklių, WC, laiptai prie lankomų objektų)						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
13.2.1.	Apžvalgos aikštelės	Apžvalgos aikštelės su reikiama infrastruktūra įrengti prie objektų Nr. 11 (Papilės piliakalnis II) ir Nr. 13 (Raudonskardžio geologinė atodanga), nuo kurių atsiveria vaizdinga panorama.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		
13.2.2.	Laužavietės	Įrengti laužavietes penkiose vietose, prie objektų Nr. 9 (Planuojama lauko akmenų galerija), Nr. 10 (Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada), Nr. 13 (Raudonskardžio geologinė atodanga), Nr.14 (Augustaičių vandens malūnas ir žirgynas) ir Nr. 15 (Daubiškių slėnis su lauko estrada). Ant objekto Nr. 11 (Papilės piliakalnis II) numatoma įrengti aukuro vietą, skirtą kūrenti ugnį švenčių metu.	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. Ventos regioninio parko direkcija.	Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		Įrengta laužavietė prie objekto Nr. 9 (Planuojama lauko akmenų galerija)

13.2.3.	Poilsiavietės	Įrengti poilsiavietę prie objekto Nr. 15 (Daubiškių slėnis su lauko estrada), kuri nustatyta vadovaujantis Ventos regioninio parko tvarkymo planu.	Ventos regioninio parko direkcija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Įgyvendinta	2015	Įgyvendino Daubiškių kaimo bendruomenė
13.2.4.	Laiptai prie lankomų objektų	Sutvarkyti esamus laiptus prie lankomų objektų Nr. 7 (Papilės piliakalnis I), Nr. 2 (S. Daukanto memorialinis muziejus su Lakštingalų slėniu), Nr. 13 (Raudonskardžio geologinė atodanga), įrengiant saugias laiptų pakopas, turėklus. Įrengti naujus laiptus prie objektų Nr. 11 (Papilės piliakalnis II) ir Nr. 12 (Papilės Jūros periodo atodanga).	1. Ventos regioninio parko direkcija. 2. Papilės seniūnija.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2020	Vykdoma		1. Sutvarkyti laiptai prie lankomo objekto Nr. 2 (S. Daukanto memorialinis muziejus su Lakštingalų slėniu). 2. Įrengti nauji laiptai prie objekto Nr. 12 (Papilės Jūros periodo atodanga).

Teigiamos tendencijos: Įrengta prieplauka prie Jurakalnio Jūros geologinės atodangos ir atragio. Įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės prie Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada ir Raudonskardžio geologinės atodangos. Įrengtas Jurakalnio geologinis – pažintinis takas Papilės seniūnijoje. Sutvarkyti laiptai prie S. Daukanto memorialinio muziejaus su Lakštingalų slėniu. Įrengti nauji laiptai prie Papilės Jūros periodo atodangos. Įrengta laužavietė prie lauko akmenų galerijos.

Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.

14.	Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
14.1.	Naujoji Akmenė						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
14.1.1.	L. Petravičiaus a. prieigos	Didžiųjų prekybos centrų plėtra šioje zonoje ribojama, paliekant esamą aptarnavimo lygį. Galima tik mažesnių nei 1000 kv. m. bendrojo ploto prekybos	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

		centrų plėtra, pagal parengtus techninius projektus.							
14.1.2.	Vietos naujiems didiesiems prekybos centrams statyti	1. 4 vietos naujiems didiesiems prekybos centrams statyti: 1.1. Respublikos g. prie turgavietės (5000 kv. m.); 1.2. Vytauto g. Ramučių g. (1500 kv. m.). 1.3. V. Kudirkos g. 18 (1800 kv. m.); 1.4. V. Kudirkos g. prie degalinės ir autobusų stoties (3500 kv. m.) pagal parengtus techninius projektus, gavus statybą leidžiančius dokumentus. 2. Taip pat teritorijoje gali atsirasti ir mažesnių prekybos centrų, nepatenkančių į didžiųjų prekybos įmonių kategoriją. pagal parengtus techninius projektus, gavus statybą leidžiančius dokumentus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
14.2.	Akmenė						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
14.2.1.	K. Kasakausko g.	Didžiųjų prekybos centrų plėtra šioje zonoje apribojama paliekant esamą aptarnavimo lygį. Galima tik mažesnių nei 1000 kv. m. bendrojo ploto prekybos centrų plėtra, pagal parengtus techninius projektus ir gavus statybą leidžiančius dokumentus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
14.2.2.	Vietos naujiems didiesiems prekybos centrams statyti	1. 3 vietos naujiems didiesiems prekybos centrams statyti: 1.1. Prie kelio Naujoji Akmenė - Akmenė - Venta (3500 kv. m.); 1.2. K. Kasakausko g. (1500 kv. m.); 1.3. K. Kasakausko g.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

		pabaigoje prie kelio Naujoji Akmenė - Akmenė - Venta (3500 kv. m.), pagal parengtus techninius projektus ir gautus statybą leidžiančius dokumentus. 2. Taip pat teritorijoje gali atsirasti ir mažesnių prekybos centrų, nepatenkančių į didžiųjų prekybos įmonių kategoriją, pagal parengtus techninius projektus ir gautus statybą leidžiančius dokumentus.							
14.3.	Venta						Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
14.3.1.	Žemaičių g. aplink seniūnijos ir kultūros centro - bibliotekos pastatus	Didžiųjų prekybos centrų plėtra šioje zonoje apribota paliekant esamą aptarnavimo lygį. Galima tik mažesnių nei 1000 kv. m. bendrojo ploto prekybos centrų plėtra, pagal parengtus techninius projektus ir gautus statybą leidžiančius dokumentus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Nepradėta vykdyti		
14.3.2.	Vietos naujiems didiesiems prekybos centrams statyti	1. 4 vietos Žemaičių g. naujiems didiesiems prekybos centrams statyti, pagal parengtus techninius projektus ir gautus statybą leidžiančius dokumentus. 2. Taip pat teritorijoje gali atsirasti ir mažesnių prekybos centrų, nepatenkančių į didžiųjų prekybos įmonių kategoriją, pagal parengtus techninius projektus ir gautus statybą leidžiančius dokumentus.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2016-07-11 išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-62-160711-00010

Teigiamos tendencijos: Rengiant prekybos centrų statybos projektus vadovaujamasi specialiojo plano sprendiniais ir įgyvendinamas jų turinys. Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.									
15.	Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
15.1.	Specialiojo plano sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: Vykdamos priemonės: Nepradėtos vykdyti priemonės: Neįgyvendintos priemonės: Iš viso:		
15.1.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	Parengtas techninis projektas	1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2. UAB „Akmenės vandenys“.	1. Europos Sąjungos paramos lėšos 2. Valstybės biudžeto lėšos 3.Savivaldybės biudžeto lėšos 4.Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos 5.Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos 6.Europos Sąjungos paramos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos 7. Kiti šaltiniai (tinkamą palikti)	2008	2020	Įgyvendinta		2014-10-14 išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui.
Teigiamos tendencijos: Parengtas Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas. Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.									
16.	Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0		


							Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
16.1.	Kultūros paveldo objektų tvarkymo sprendinių apibendrinimai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
16.1.1.	Sprendinių įgyvendinimui užtikrinti reikalingi parengti (atnaujinti) planavimo dokumentai ir (ar) projektai	1. Paveldo objektų koncentracijos arealams priskirtų vietovių ir paveldo objektų jose pritaikymo intensyviai lankymui ir kultūriniam pažintiniam turizmui galimybių studijos. 2. Architektūrinio paveldo kompleksams priskirtų vietovių ir paveldo objektų jose pritaikymo intensyviai sezoniniam lankymui ir kultūriniam pažintiniam turizmui galimybių studijos. 3. Specializuoto paveldo objektų vietovėms priskirtų paveldo objektų ir jų kompleksų pritaikymo periodiniam lankymui ir pažinimui galimybių studijos.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		2014 m. parengta Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija.
16.2.	Viešosios reklamos įrenginių išdėstymo sprendinių apibendrinimai						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
16.2.1.	Sprendinių įgyvendinimui užtikrinti reikalingi parengti	1. Pagrindinių Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (Naujosios Akmenės, Akmenės, ir Ventos miestų,	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Kiti šaltiniai	2008	2020	Vykdoma		Vykdoma

	(atnaujinti) dokumentai ir (ar) projektai	Papilės ir Kruopių miestelių viešosios informacijos įrenginių (iškabų, stendų ir pan.) vieningo dizaino projektai. 2. Viešosios informacijos punktų (turizmo, kultūros paveldo, saugomų teritorijų) bei jų priklausinių vieningo dizaino projektai. 3. Savivaldybės teritorijoje esančių riboženklių (valstybės sienos, savivaldybės teritorijos ribos ant krašto ir rajoninių kelių, pagrindinių gyvenamųjų vietovių ribų) vieningo dizaino projektai. 4. Didelių ir labai didelių gabaritų reklamos stendų ir lauko ekranų projektai. 5. Laikinosios komercinės reklamos masinių kultūrinių ir sporto renginių metu įrengimo taisyklės. 6. Išorinės vaizdinės reklamos įrenginių sklaidos Akmenės rajono savivaldybėje stebėsena ir registro sudarymas.							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--


Teigiamos tendencijos: Parengta Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija.

Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.


II. Išvados: 2013 – 2016 m. bendrojo plano įgyvendinimas.

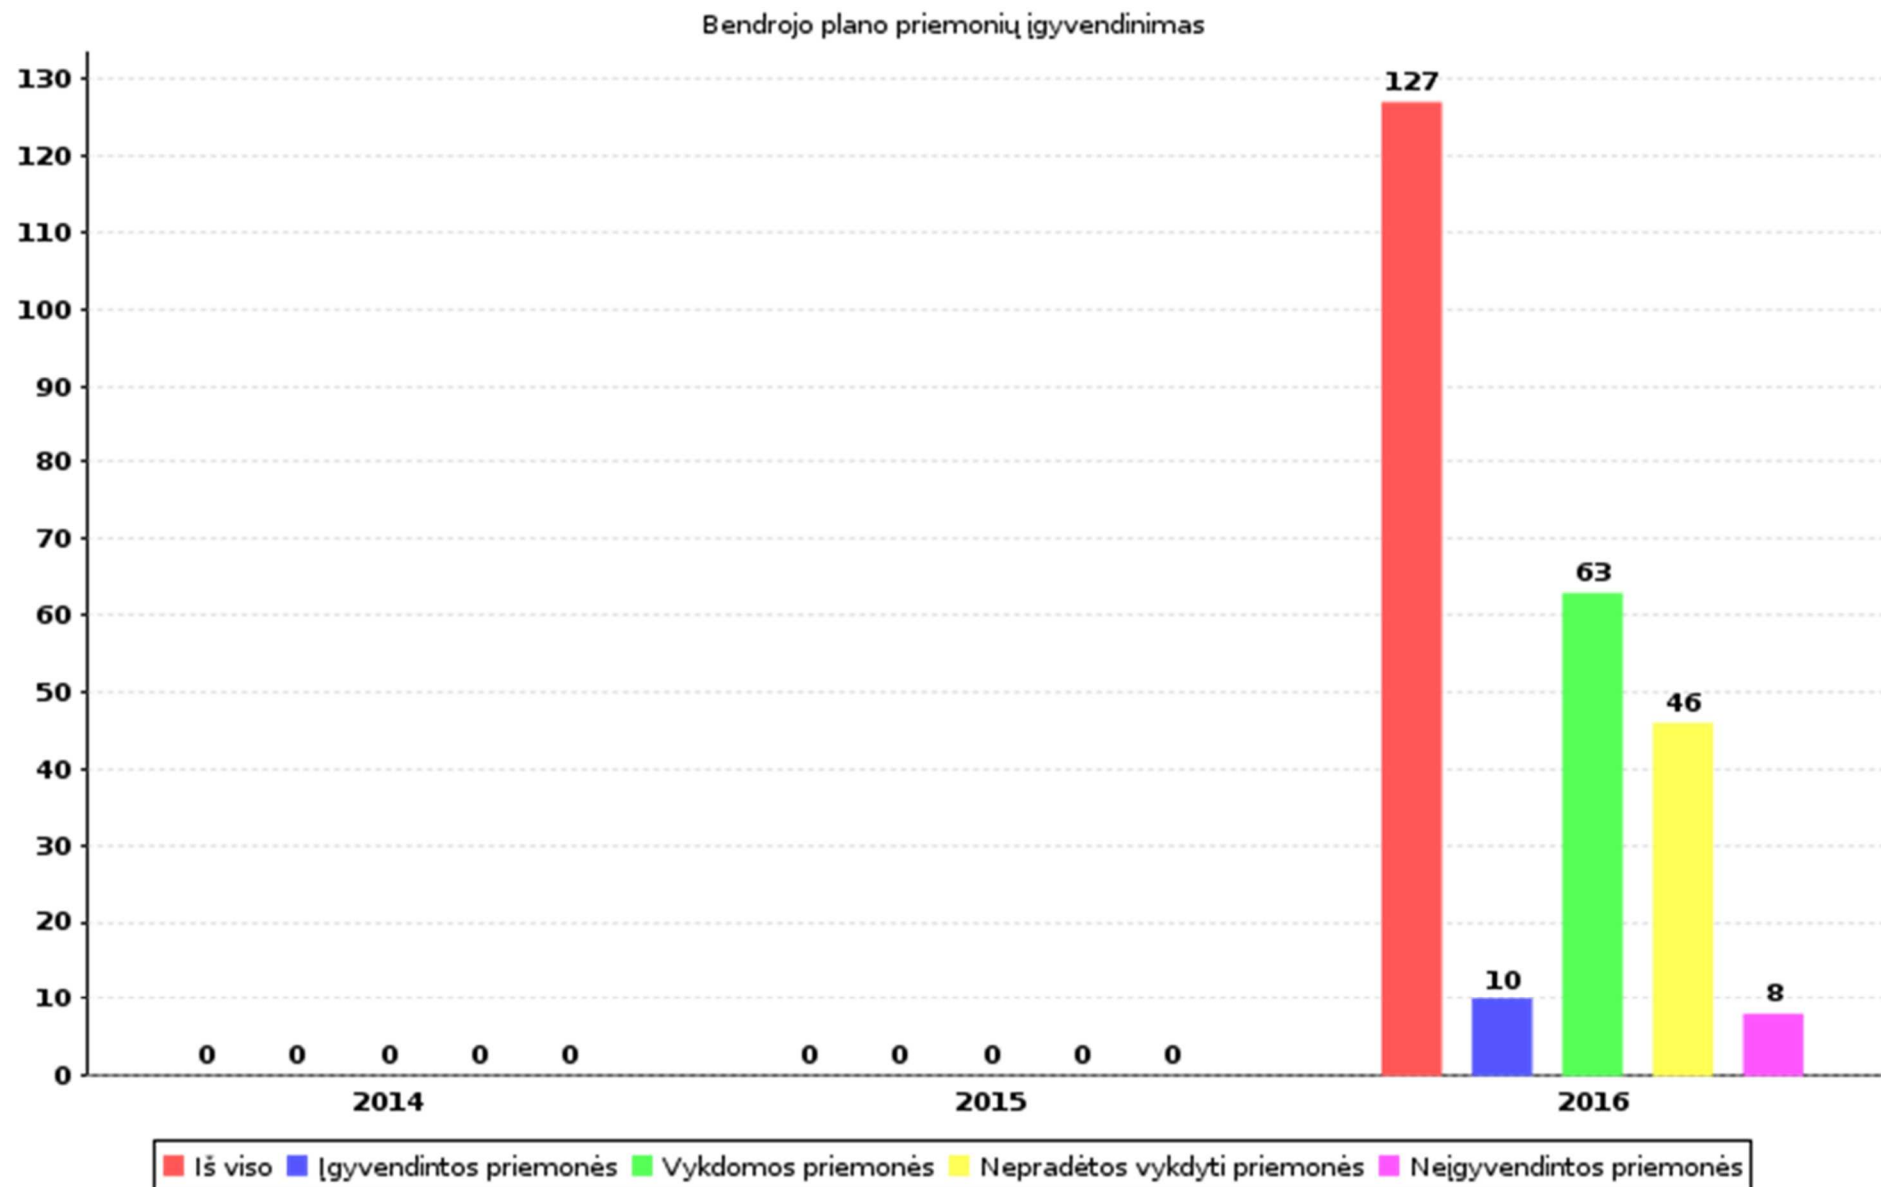


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

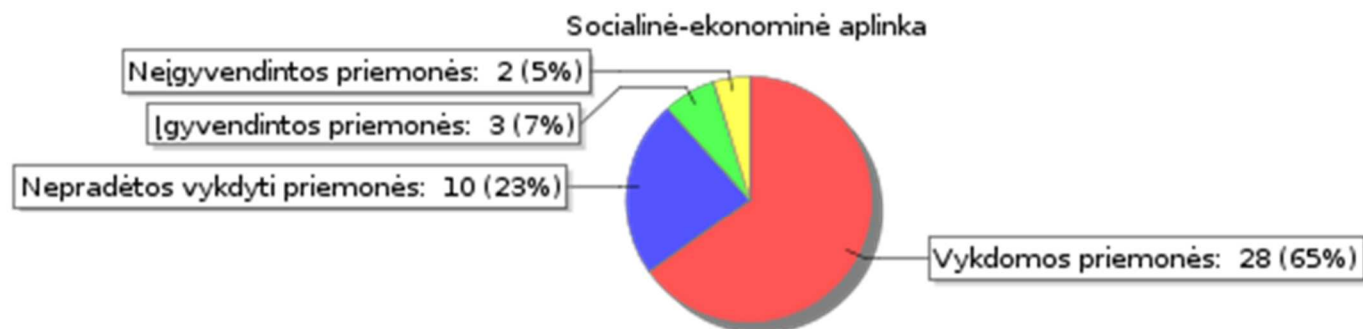

● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

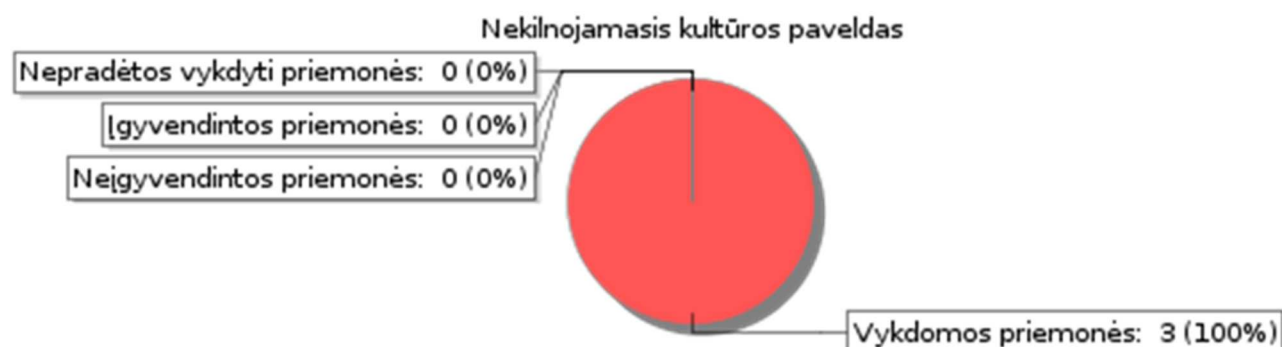


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

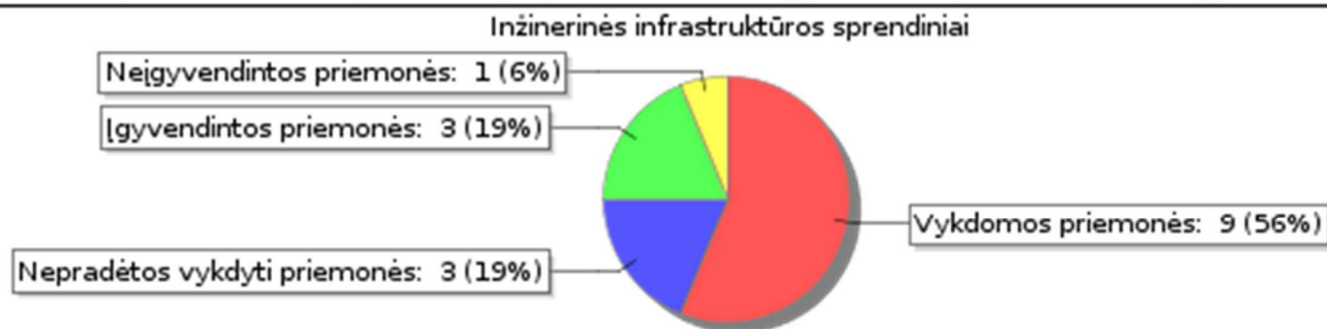


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas

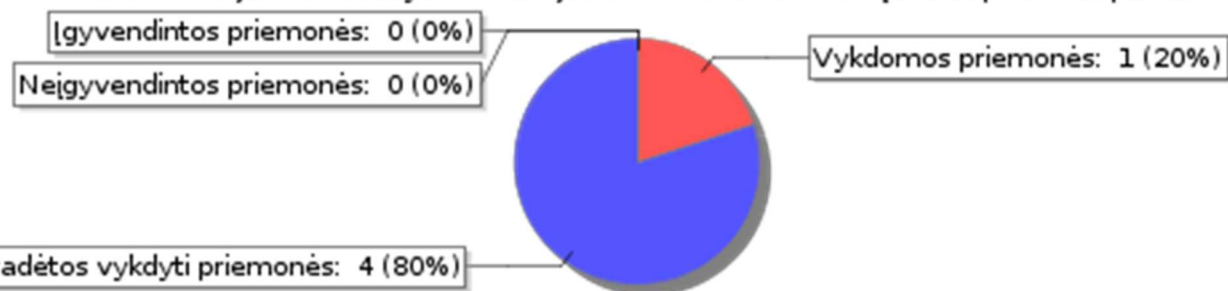


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas

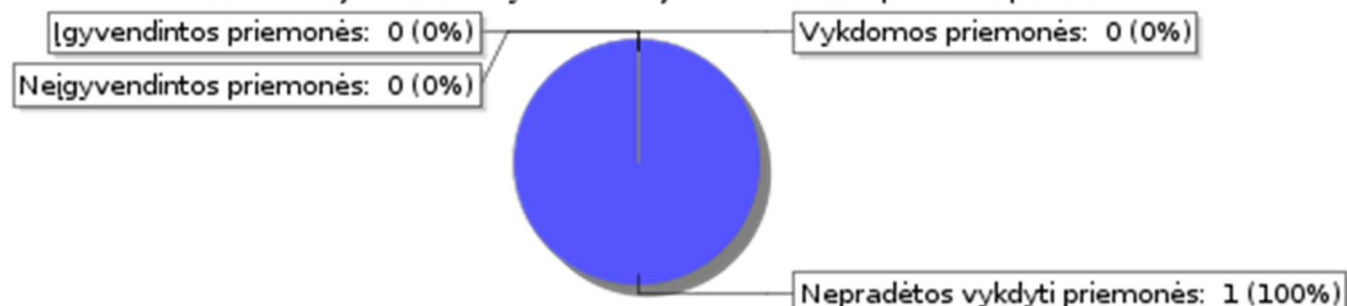


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

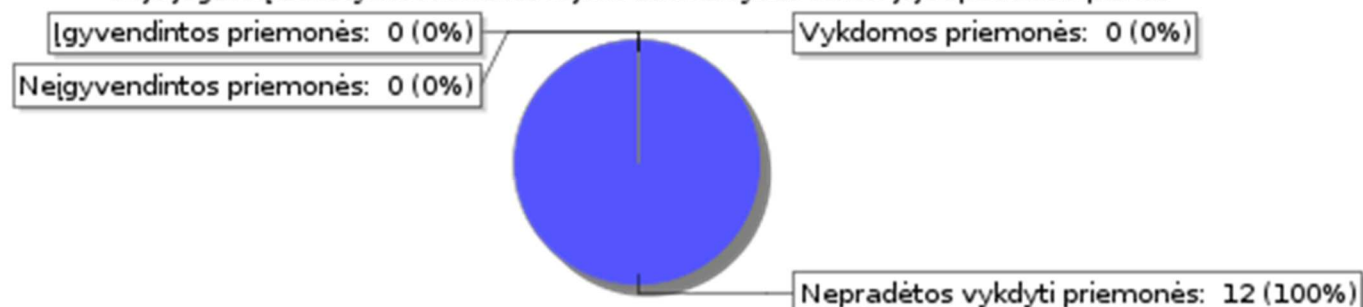


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

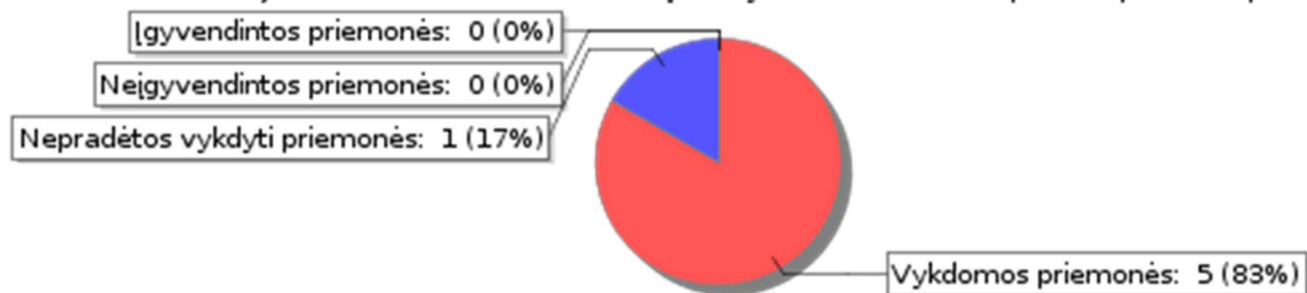


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis planas

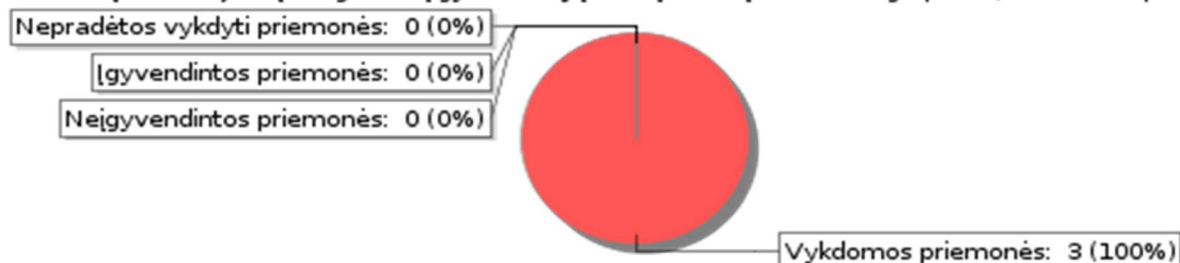


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

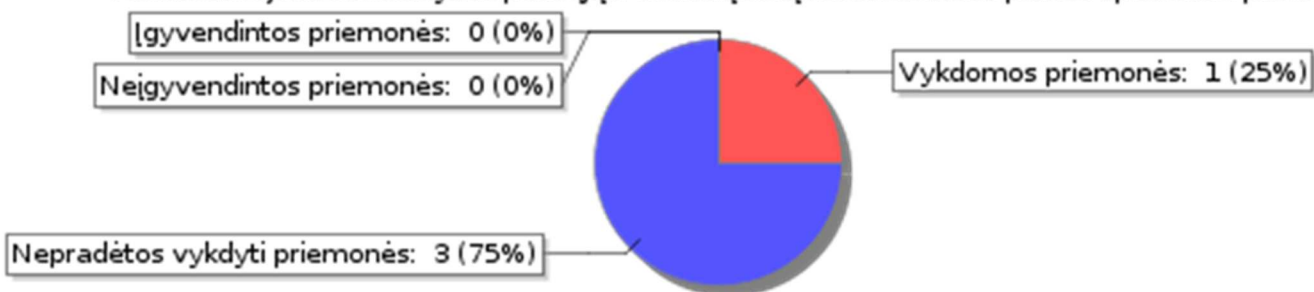


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

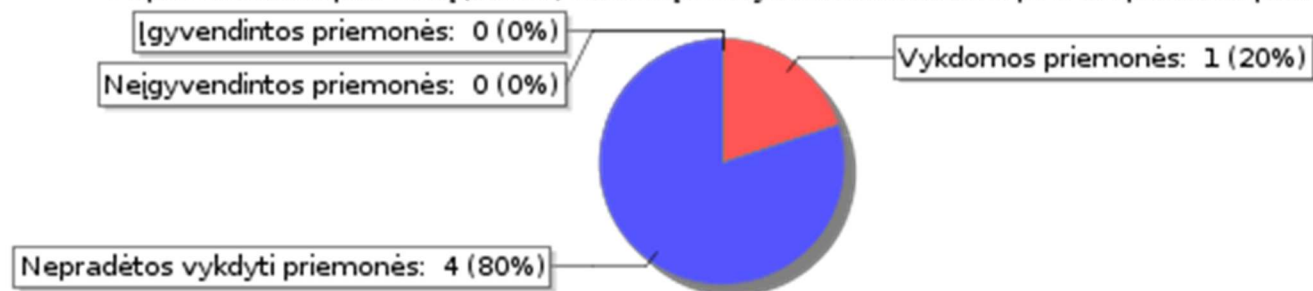


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas

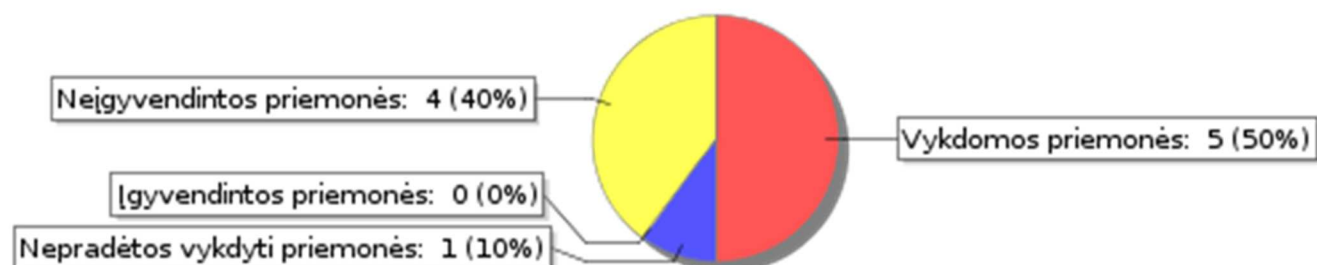


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas

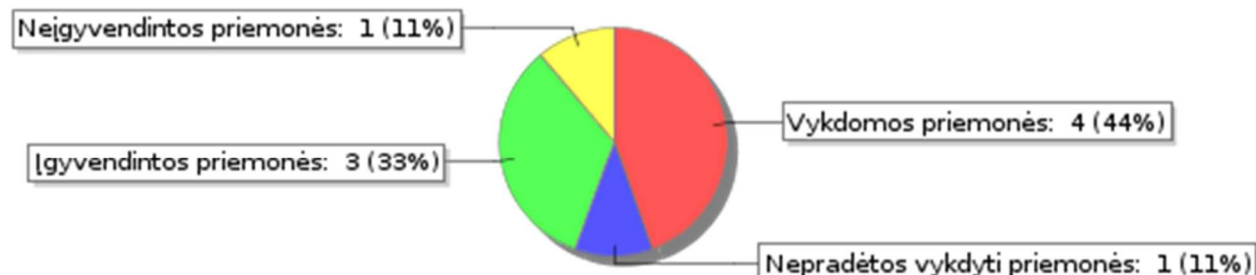


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

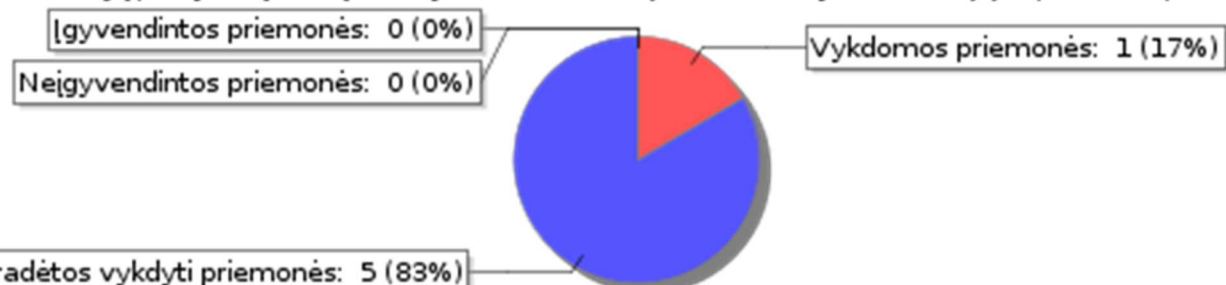


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas

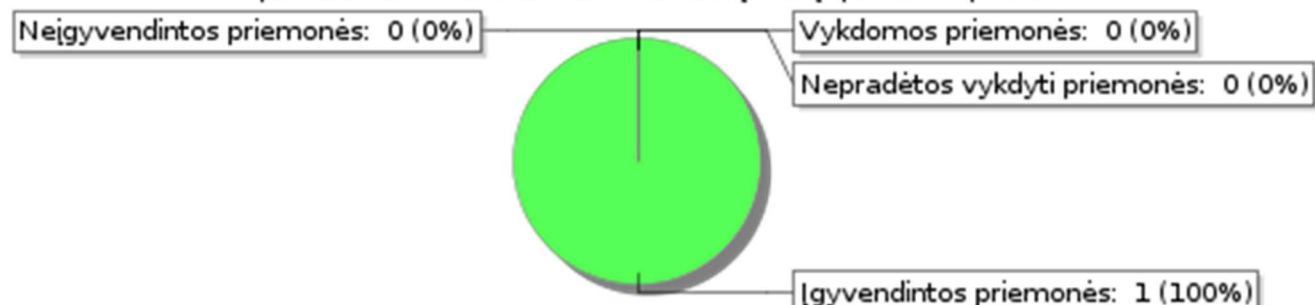

● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas

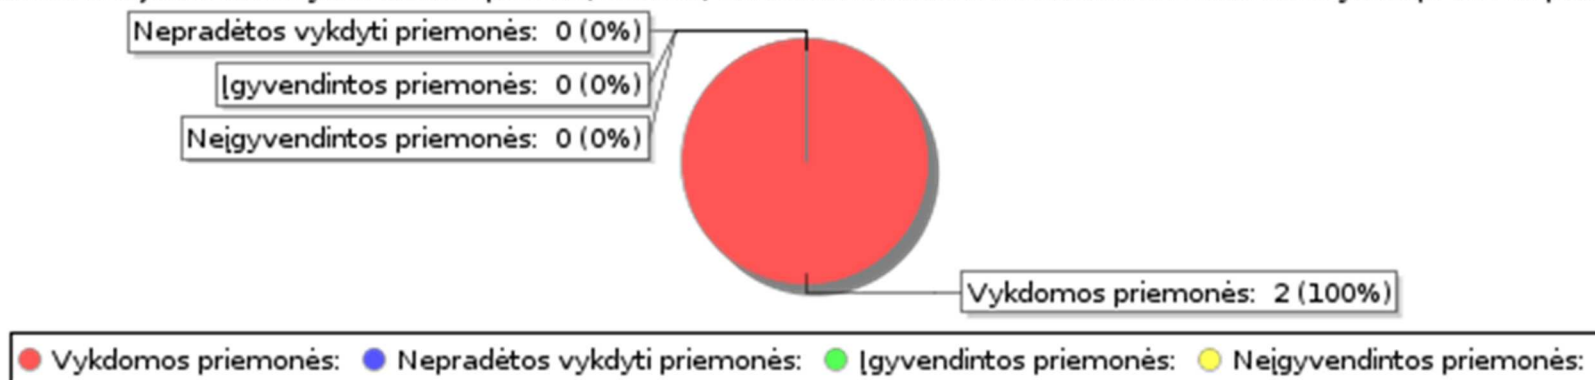

III. Prognozės

- Akmenės rajono bendrojo plano sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, bendrojo plano sprendiniai iš esmės vykdomi.
- Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti Akmenės rajono teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.
- Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
- Atlikus bendrojo plano sprendinių keitimą, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, patikslinus reglamentavimą, integravus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų palengvintas ir supaprastintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai.

IV. Siūlymai

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Akmenės rajono Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją. Šiame Bendrojo plano stebėsenos dokumente pateikiamas sprendinių aktualumo, įgyvendinimo eigos bei pokyčių rajono struktūroje Bendrojo plano galiojimo metu vertinimas, kuris gali teigiamai įtakoti priemonių plano įgyvendinimą.

- Rengiant Akmenės rajono savivaldybės plėtros planus, tikslinga Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

- Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.
- Keičiant Akmenės rajono teritorijos bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl bendrojo plano keitimo:

2008 m. birželio 27 d. patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas planuojamu laikotarpiu (2008-2020 metais) atlieka svarbų vaidmenį planuojant ir valdant investicijas. Pasikeitus esamai situacijai, plėtros tendencijoms ir teisiniam teritorijų planavimo reguliavimui šiuo metu galiojantis Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir jo sudėtinės dalys nepilnai atitinka dabarties poreikius ir yra keistinas:

- Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus;
- Patikslinti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas;
- Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
- Numatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą;
- Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams;
- Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
- Peržiūrėti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas didžiųjų prekybos centrų teritorijas, patikslinti ir (ar) numatyti naujas teritorijas prekybos centrų statybai;
- Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, Savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių;
- Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.
- Atsižvelgti į valstybės lygmens Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą ir perkelti jo sprendinius. Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano pagrindinėmis nuostatomis, keičiant ar koreguojant Akmenės rajono savivaldybės bendrąjį planą, būtina nustatyti

kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Akmenės rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus. Keičiamame ar koreguojamame Akmenės rajono savivaldybės bendrajame plane reikia numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą.

- Nustatyti tūrinę/erdvinę rajono vystymo koncepciją.
- Nustatyti rajono teritorijos funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius kraštovaizdžio tvarkymo priemones.
- Siekiant nustatyti aiškias sąlygas investicijoms, reikia papildyti Akmenės rajono bendrojo plano sprendinius, išskiriant prioritетines plėtros teritorijas.
- Atsižvelgiant į rajono ir atskirų urbanizuotų gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimą bei šiuolaikines judumo skatinimo tendencijas, teikiamą prioritetą bemotoriam transportui, viešajam transportui ir skirtingų transporto rūšių integravimui, reikia peržiūrėti Akmenės rajono bendrojo plano susisiekimo sistemos dalies sprendinius ir juos įvertinti.

Kiti siūlymai:

- Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvą: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).
- Siekiant Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėseną atlikti kokybiškiau ir tikslingiau, reikalinga formuoti bendrojo plano sprendinius konkretesnius ir labiau apibrėžtus, išlaikant dokumento sprendinių daugiafunkciškumą.
- Nusprendus atlikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir (ar) jo dalių keitimą, informuoti visuomenę, kad būtų pakankamai laiko gauti motyvuotus siūlymus bendrojo plano sprendinių keitimui.
